

**Aménagement du carrefour le poteau
d'Yvrac et de l'avenue du Périgord
Réunion d'information de chantier
27-06-2023**

Introduction




L'aménagement du Poteau d'Yvrac consiste à reprendre dans son ensemble **le profil existant et l'ambiance générale** de façon à assurer la sécurité et la lisibilité des différents usages et à mettre en valeur l'entrée d'agglomération.

Pour atteindre cet objectif il est proposé de réaliser une voie verte positionnée côté sud de façon à raccorder celle qui est en cours de réalisation coté Ouest et de créer des espaces verts et du stationnement longitudinal là où c'est possible,

Plan général d'aménagement

COUPE DE PRINCIPE

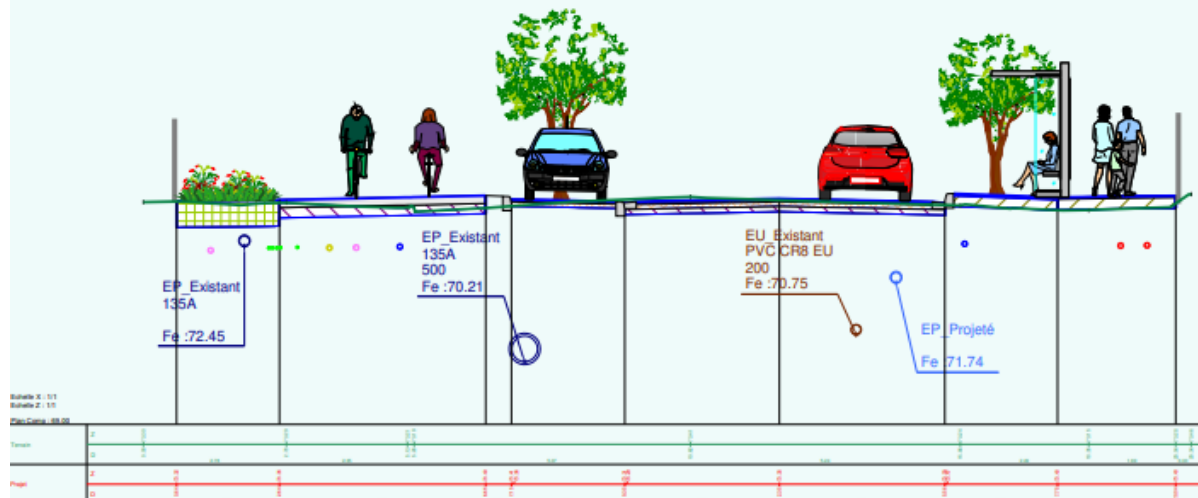

Perspective 1 = point de vue large Commerces + plantations



Perspective 2 = point de vue restaurant + plantations



Perspective 3 = point de vue poissonnerie



Etat des travaux préalables en cours

- **Dévolement GRDF** : travaux terminés depuis mi avril
- **Travaux d'enfouissement des réseaux** : Les travaux de génie civil pour l'enfouissement se termineront vers mi-aout. Suivront les travaux de câblage et la dépose des poteaux puis la pose des candélabres.
 - **Dissimulation de la HTA** :
 - Dépose de 160m de réseau aérien et pose en sol de 130m de câble.
 - **Dissimulation du réseau Basse tension/ Télécom et éclairage public sur 300m**
- La Basse Tension et la HTA sont sous financement **Bordeaux métropole**
- Les Telecom et l'éclairage public sont sous maitrise d'ouvrage **Ville**
- **Renouvellement du réseau d'eaux usées** prévu en juin/juillet
- **Dévolement du réseau d'eau potable** début juillet (délai 3 semaines)

Dossier d'exploitation

- Pour faciliter la circulation et la vie du quartier, il a été nécessaire d'étudier **un phasage des travaux** ainsi que des **itinéraires de délestage ou de déviation**
- **7 phases de travaux** sont nécessaires à la réalisation des travaux
- **7 plans de déviations associées**
- **Accès aux commerces et aux riverains constamment maintenus**
- **Démarrage du chantier voirie : 31 juillet 2023**
- La durée des travaux prévisionnelle de **6 mois** (hors intempéries et impondérables)

Phase 0

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / voie sortante avenue des Tabernottes :

- Installation de chantier et mise en place du balisage "Travaux"
- Mise en place de la signalisation provisoire (déviations VL et PL)
- Démolitions diverses
- Rabotage sur linéaire réseau EP
- Travaux d'assainissement avec réfection provisoire de chaussée (terrassement à l'aspiratrice + pose d'une nouvelle conduite y compris regard de visite + raccordement sur existant)

Raccordement sur Avenue des Tabernottes
Réseau "Est"
Réseau "Ouest"

NOTA : La voirie existante n'est pas traitée dans cette phase

NOTA 2 : Une bande piétonne de 1.40m sera mise en place pour l'accès des riverains

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Est-Ouest avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).

Double sens conservé entre rue Sainte Fiacre et avenue Fontderode.

Avenue des Tabernottes :

Avenue barrée -> Suivre déviation

Avenue de la Moune :

Maintien du double sens de circulation.

Légende


- Zone de Travail
- Barrière type K16 ou K5c
- Marquage au sol provisoire
- Assainissement
- Circulation Générale
- Circulation Piétonne
- Entrée / sortie de chantier

Revêtements des travaux finis :

- Enrobé définitif
- Béton
- Espaces Verts
- Espaces Verts

Planning

Sans échelle

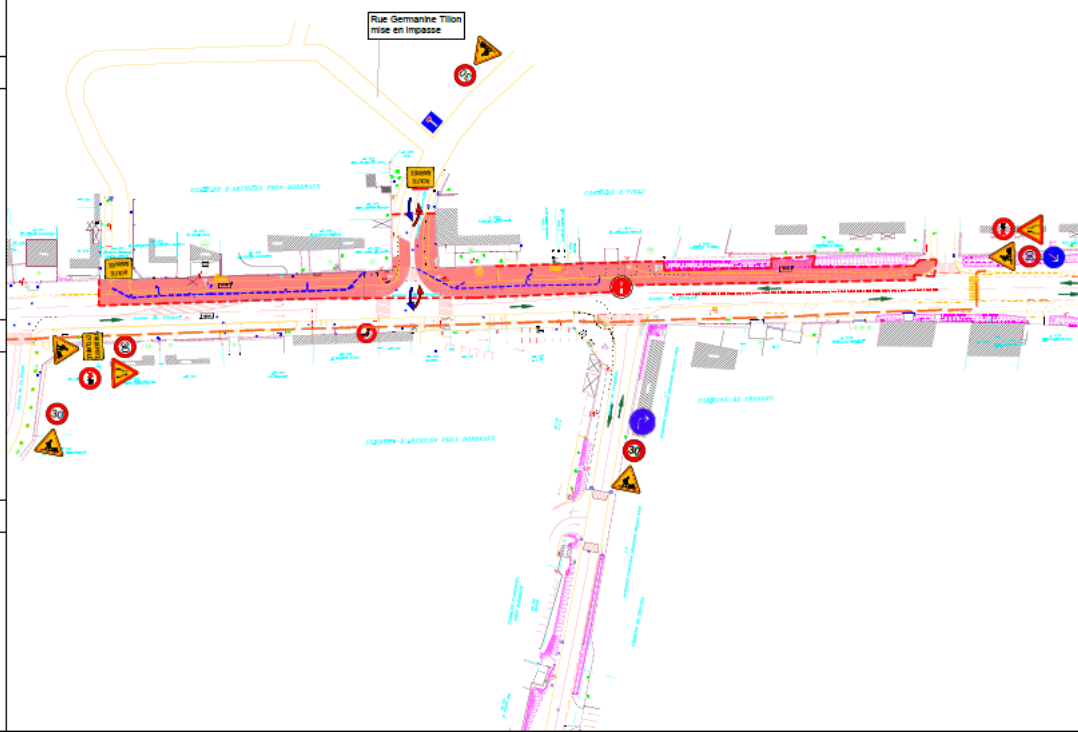

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - PHASE 0



Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / voie entrante avenue des Tabernottes :

- Modification de la signalisation provisoire
- Dépose de mobiliers urbains, panneaux et bordures
- Engravure
- Terrassement voirie, trottoir, espace vert et voie verte
- Pose des bordures
- Mise en place de la structure (Voie verte, voirie, stationnement et trottoir)

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Est-Ouest avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).
Double sens conservé entre rue Sainte Fiacre et avenue Fontderode.

Avenue des Tabernottes :

Fermeture de la voie entrante avec le maintien à double sens de circulation.

Avenue de Fontderode :

Interdiction de tourner à gauche.

Commerces :

Maintien des accès aux commerces (piétons et VL pour le garage)

Légende


- Zone de Travaux
- Barrière type K16 ou K5c
- Marquage au sol provisoire
- Assainissement
- Circulation Générale
- Circulation Piétonne
- Entrée / sortie de chantier

Revêtements des travaux finis :


- Enrobé définitif
- Béton
- Espaces Verts
- Espaces Verts

Planning

Sans échelle

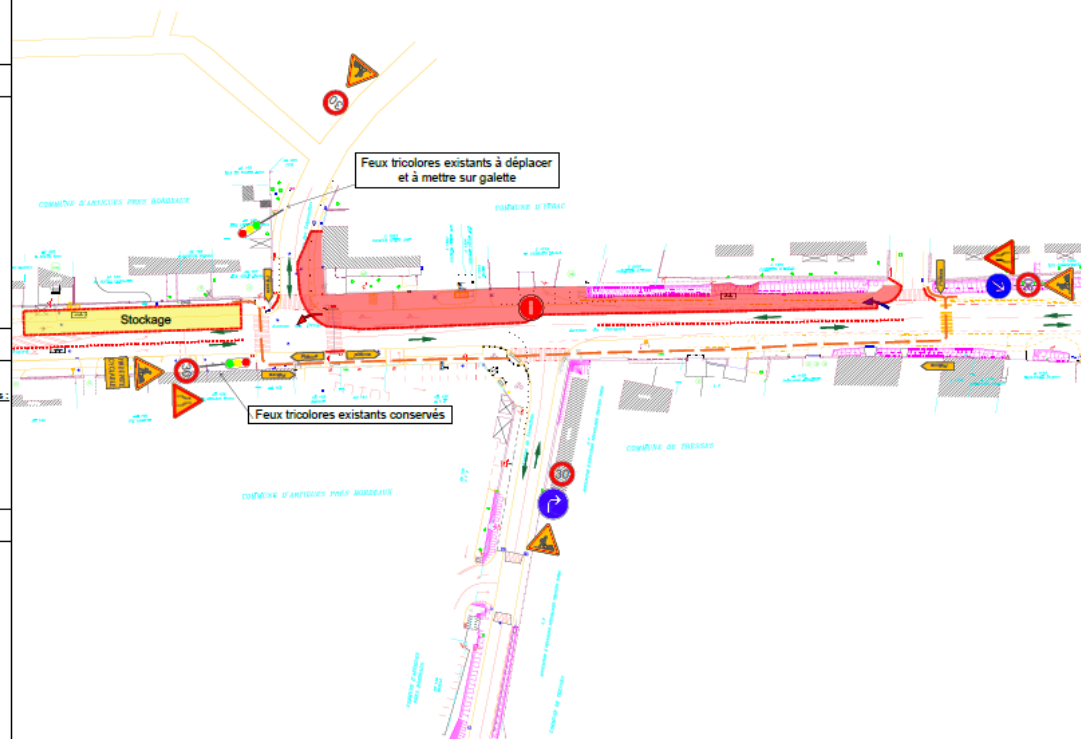

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - PHASE 1.1

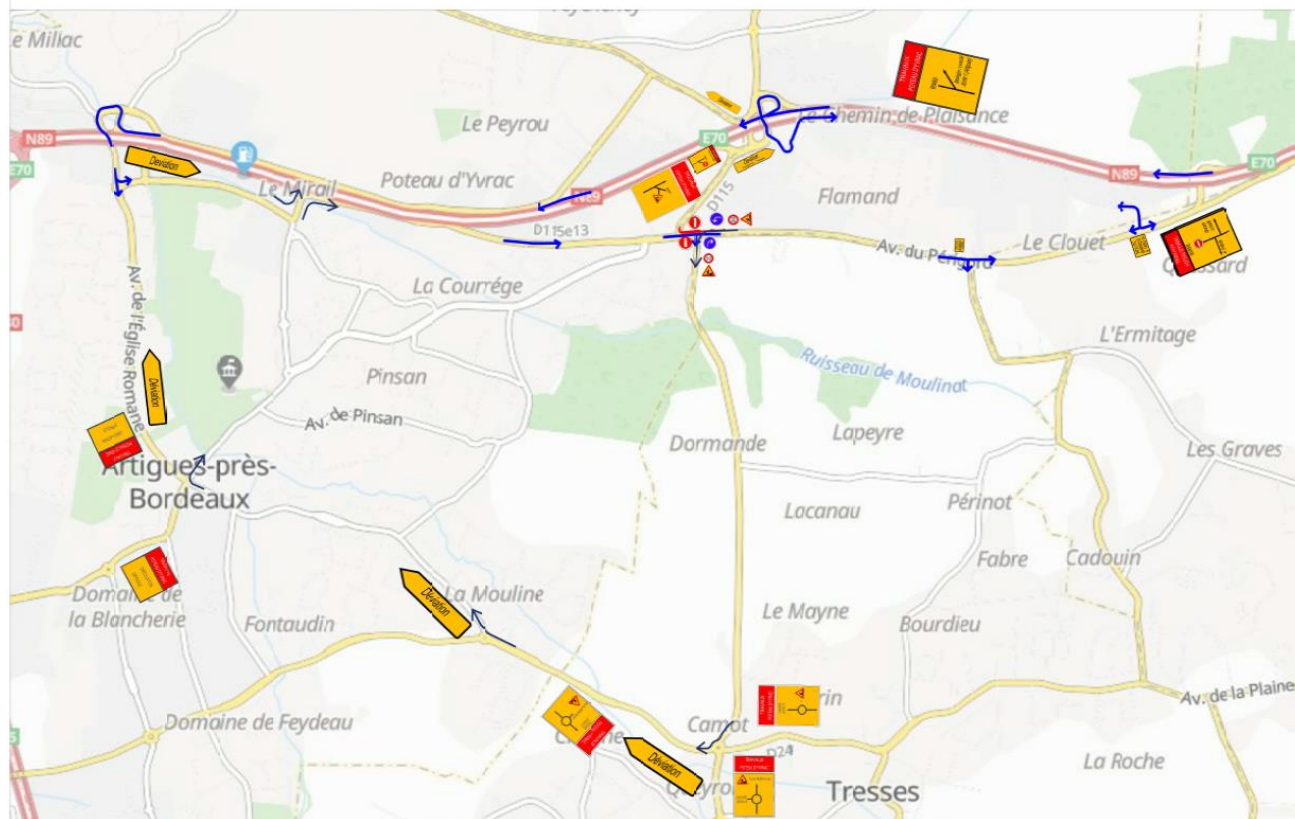

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / voie entrante avenue des Tabernottes :

- Élargissement de la zone travaux
- Démolitions diverses
- Busages fossé
- Engravure
- Terrassement voirie, trottoir, espace vert et voie verte
- Pose des bordures
- Mise en place de la structure (Voie verte, voirie, stationnement et trottoir)
- Contrôles structures
- Mise en place terre végétale
- Enrobé trottoir, stationnement et Avenue des Tabernottes
- Béton Balayé voie verte

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Est-Ouest avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).

Avenue des Tabernottes :

Fermeture de la voie entrante avec le maintien à double sens de circulation.

Avenue de Fontderode :

Interdiction de tourner à gauche.

Commerces :


Maintien des accès aux commerces (piétons et VL pour le garage)

Légende


	Zone de Travaux		Enrobé définitif
	Barrière type K16 ou K5c		Béton
	Marquage au sol provisoire		Espaces Verts
	Assainissement		Espaces Verts
	Circulation Générale		
	Circulation Piétonne		
	Entrée / sortie de chantier		

Planning

Sans échelle

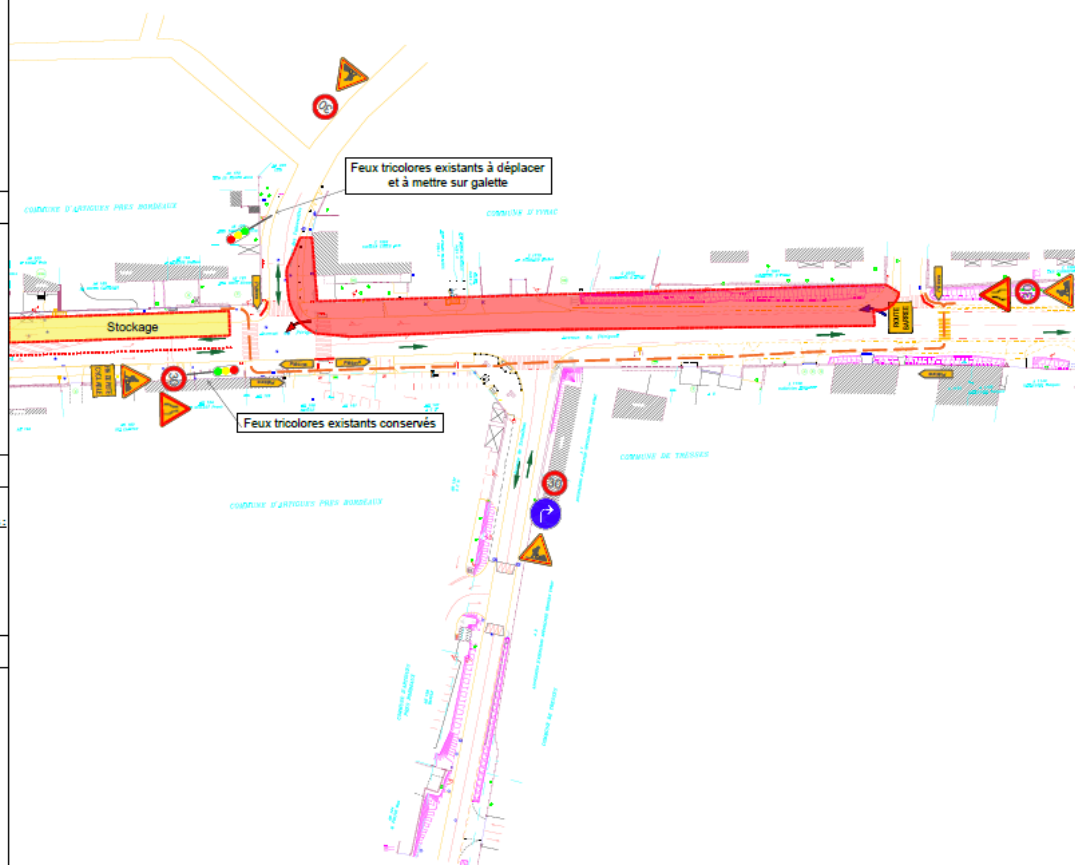

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation PHASE 1.2

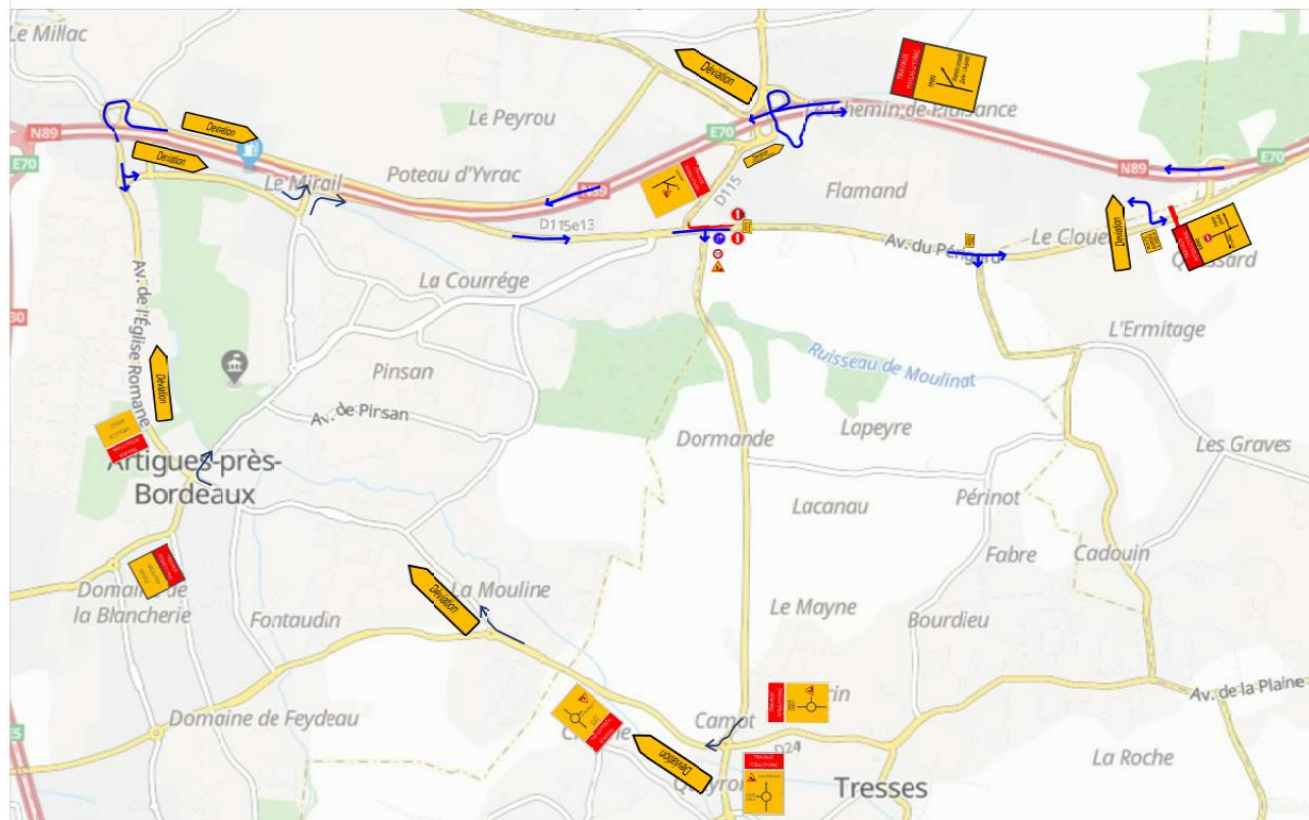

Phase 2

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / voie sortante avenue des Tabernottes :

- Installation de chantier et mise en place de la signalisation provisoire
- Dépose des mobiliers urbains (arrêt de bus), panneaux et bordures
- Engravure au droit des futures bordures
- Travaux d'assainissement (pose de nouvelle conduite y compris regard de visite + raccordement sur existant)
- Terrassement voirie, trottoir et espace vert
- Mise en place de la structure (voirie + stationnement et trottoir)
- Pose des bordures
- Mise en oeuvre de terre végétale
- Réalisation des enrobés sur le trottoir et les stationnements

NOTA : La voirie existante n'est pas traitée dans cette phase

NOTA 2 : Une bande piétonne de 1.40m sera mise en place pour l'accès des riverains

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Est-Ouest avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).

Rue Germaine Tillon :

Route barrée avec mise en impasse.

Avenue des Tabernottes :

Fermeture de la voie sortante avec le maintien à double sens de circulation. Passage possible avec feux existants conservés.

Avenue de la Moune :

Maintien du double sens de circulation. Interdiction de tourner à gauche.

Légende


- Zone de Travail
- Barrière type K16 ou K5c
- Marquage au sol provisoire
- Assainissement
- Circulation Générale
- Circulation Piétonne
- Entrée / sortie de chantier

Revêtements des travaux finis :


- Enrobé définitif
- Béton
- Espaces Verts
- Espaces Verts

Planning

Sans échelle

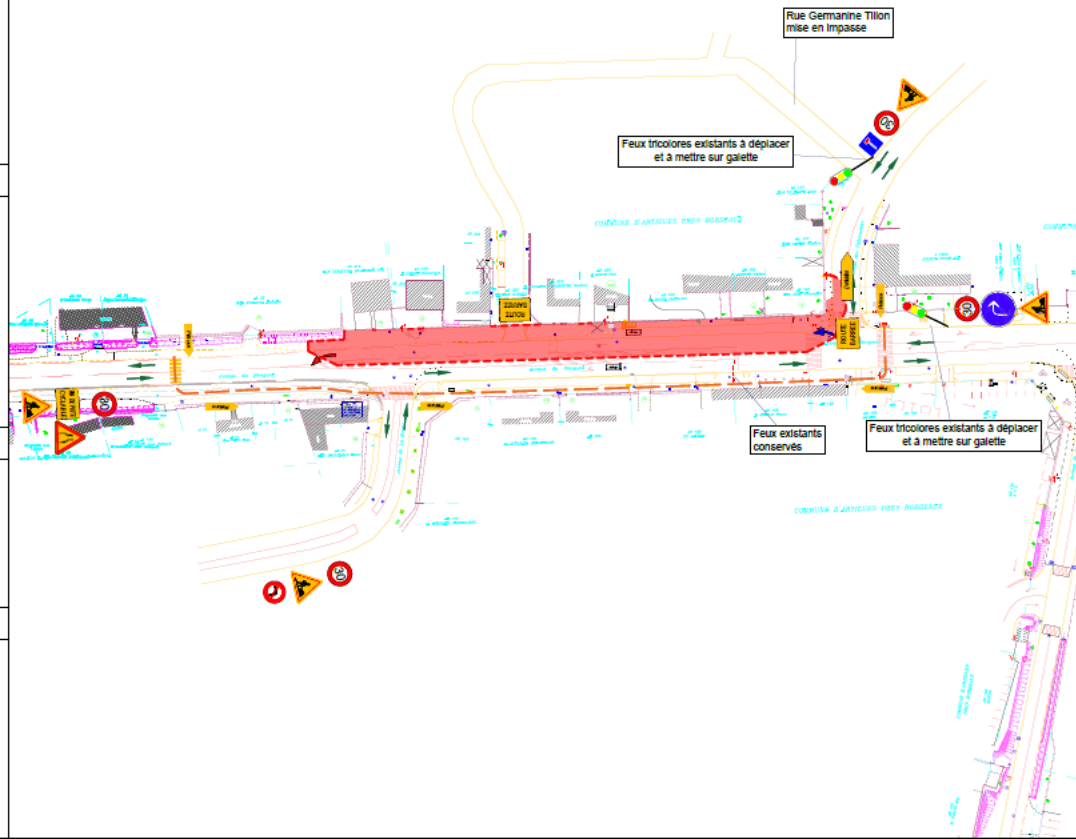

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - PHASE 2

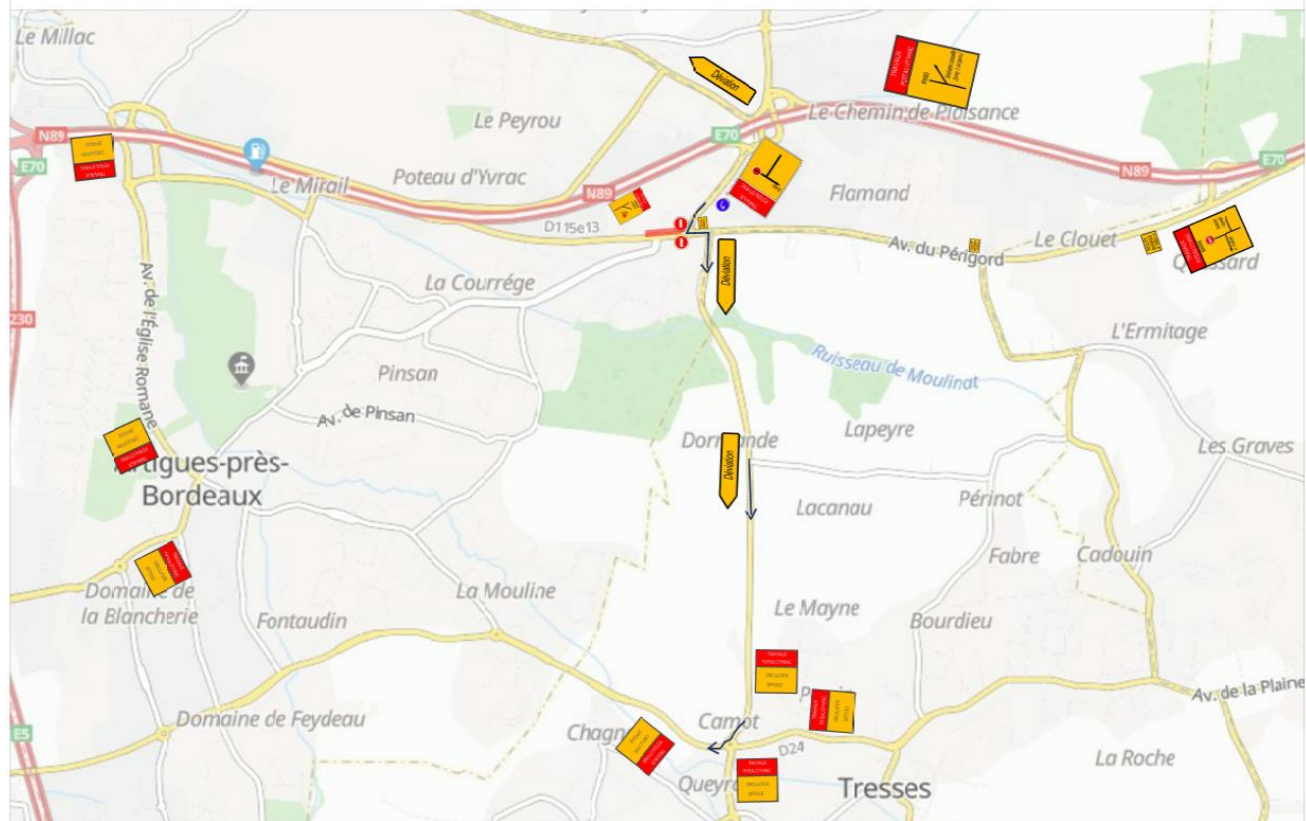

Phase 3

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / Avenue de la Moune:

- Installation de chantier et mise en place de la signalisation provisoire
- Dépose des mobiliers urbains (arrêt de bus), panneaux et bordures
- Engravures au droit de l'emplacement des futures bordures
- Travaux d'assainissement (pose de nouvelle conduite y compris regard de visite + raccordement sur existant)
- Terrassement voirie, trottoir, espace vert et voie verte
- Mise en place de la structure (voirie, stationnement, trottoir et voie verte)
- Pose des bordures
- Mise en oeuvre de terre végétale
- Réalisation des béton balayé et désactivé
- Réalisation des enrobés sur le trottoir et les stationnements

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Ouest-Est avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).

Rue Germaine Tillion

Obligation de tourner à gauche.

Avenue de la Moune :

Fermeture de l'avenue

Parking commercial et commerces:


Maintien des accès aux commerces.
Agrandissement de la sortie centrale du centre commercial afin de permettre l'entrée et la sortie des véhicules.

Légende

	Zone de Travail		
	Barrière type K16 ou K5c		Enrobé définitif
	Marquage au sol provisoire		Béton
	Assainissement		Espaces Verts
	Circulation Générale		Espaces Verts
	Circulation Piétonne		
	Entrée / sortie de chantier		


Planning

Sans échelle

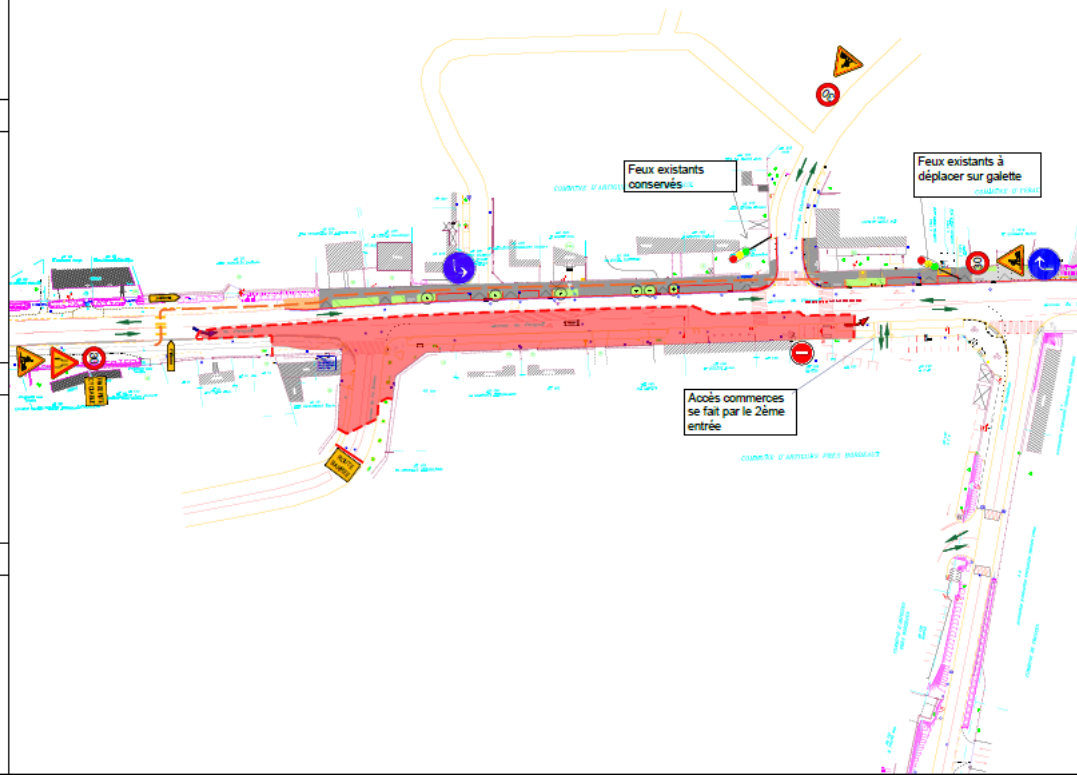

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - PHASE 3

PHASE 3

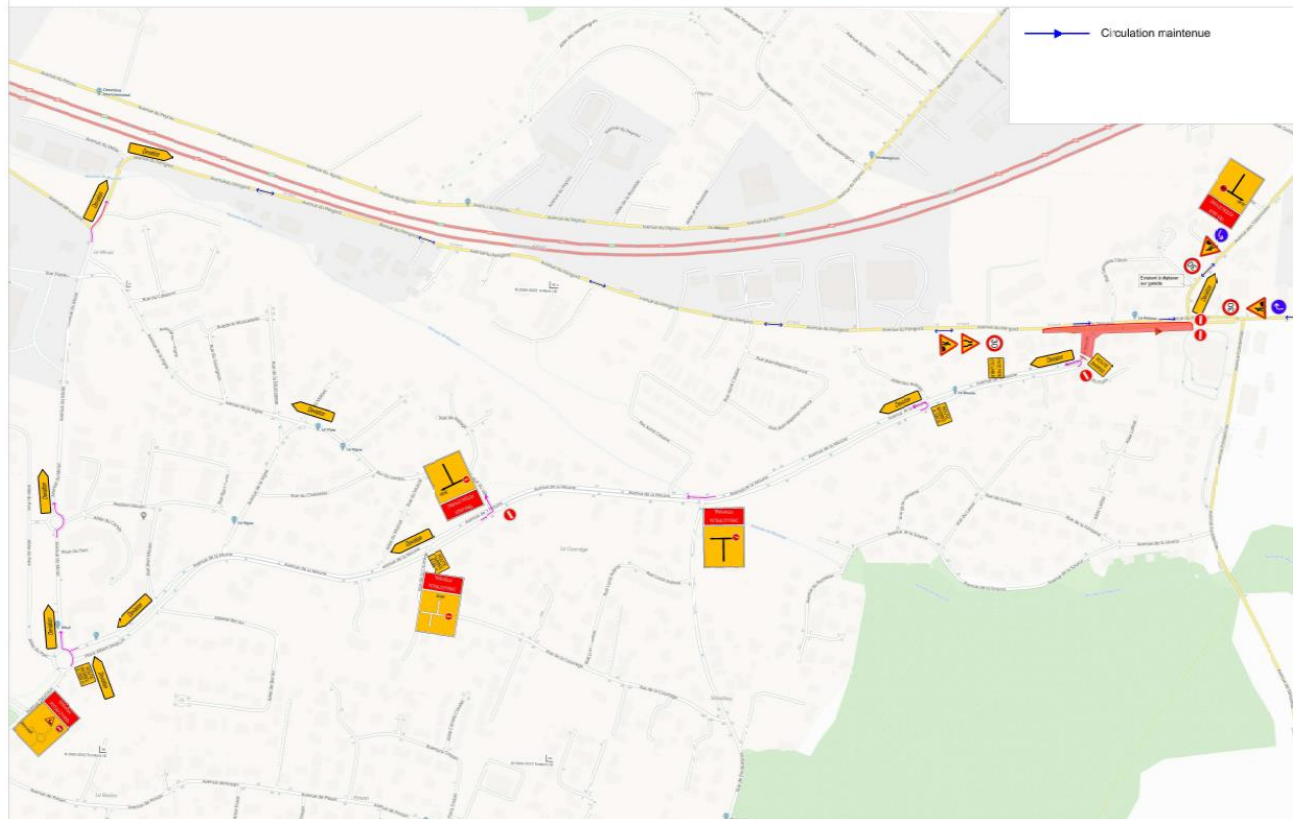

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / voie entrante avenue de Senailhas :

- Installation de chantier et mise en place de la signalisation provisoire
- Dépose des mobiliers urbains (arrêt de bus), panneaux et bordures
- Engravaure au droit des futures bordures
- Terrassement voirie, trottoir, espace vert et voie verte
- Mise en place de la structure (voirie, stationnement, trottoir et voie verte)
- Pose des bordures
- Mise en oeuvre de la terre végétale
- Mise en oeuvre béton balayé
- Réalisation des enrobés sur le trottoir et les stationnements

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de la voie Ouest-Est avec le maintien en sens unique (sens sortant de Bordeaux conservé en direction du poteau d'Yvrac).
La route sera barrée au niveau de l'avenue Fontderode.

Avenue de Fontderode :

Fermeture de la voie avec le maintien en sens unique (depuis Périgord).

Parking commercial et commerces :


Maintien des accès aux commerces.

Légende

 Zone de Travaux	
 Barrière type K16 ou K5C	
 Marquage au sol provisoire	
 Assainissement	
 Circulation Générale	
 Circulation Piétonne	
 Entrée / sortie de chantier	
	Revêtements des travaux finis :
	 Enrobé définitif
	 Béton
	 Espaces Verts
	 Espaces Verts

Planning

Sans échelle

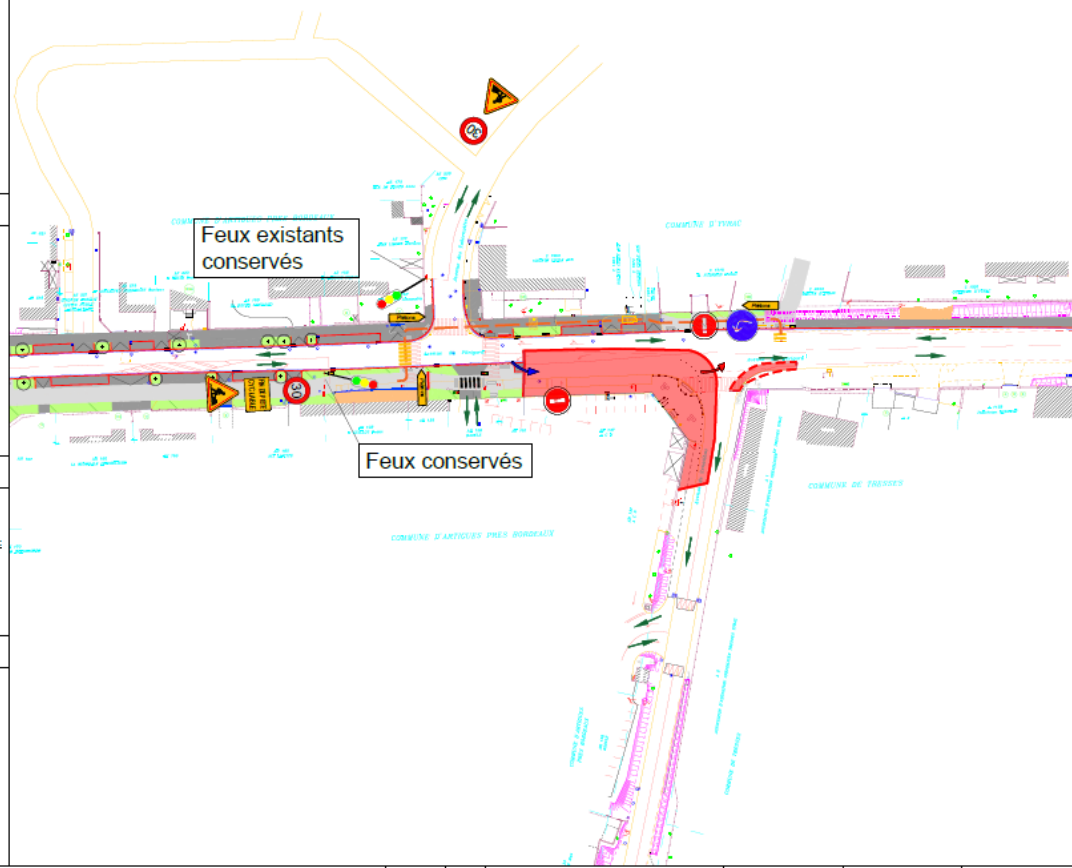

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - PHASES 4



Phase 6

Descriptions des Travaux

Avenue du Périgord / Avenue de la Moune / Avenue des Tabernottes / Avenue de Senailhas :

- Reprise de la chaussée existante (rabotage, application de la GB, tapis)
- Reprise des îlots sur voie Est.

Circulation

Avenue du Périgord :

Fermeture de l'avenue du Périgord et des accès aux 3 autres avenues, voir déviation mise en place page suivante

Légende


- Zone de Travaux
- Barrière type K16 ou K3c
- Marquage au sol provisoire
- Assainissement
- Circulation Générale
- Circulation Piétonne
- Entrée / sortie de chantier

Revêtements des travaux finis :

- Enrobé définitif
- Béton
- Espaces Verts
- Espaces Verts

Planning


Sans échelle

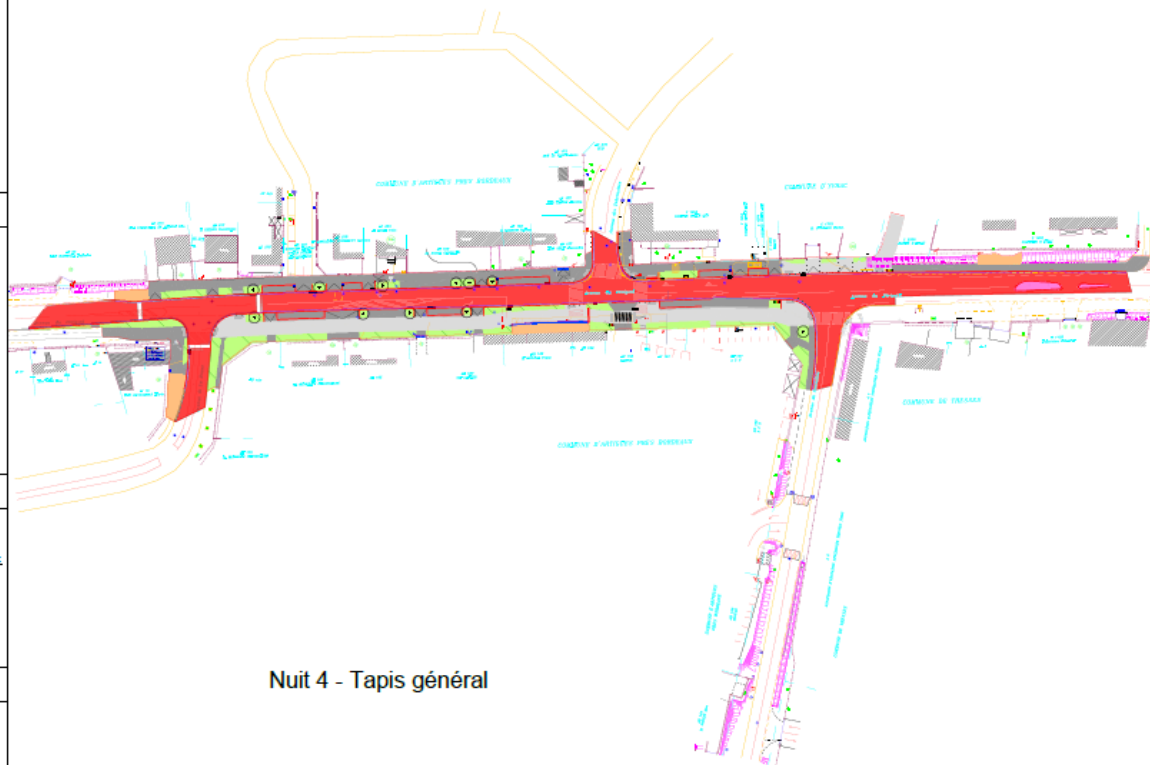

Nuit 4 - Tapis général

CARNET DE PHASAGE : Itinéraire de déviation - Travaux de Nuit

PHASE 6

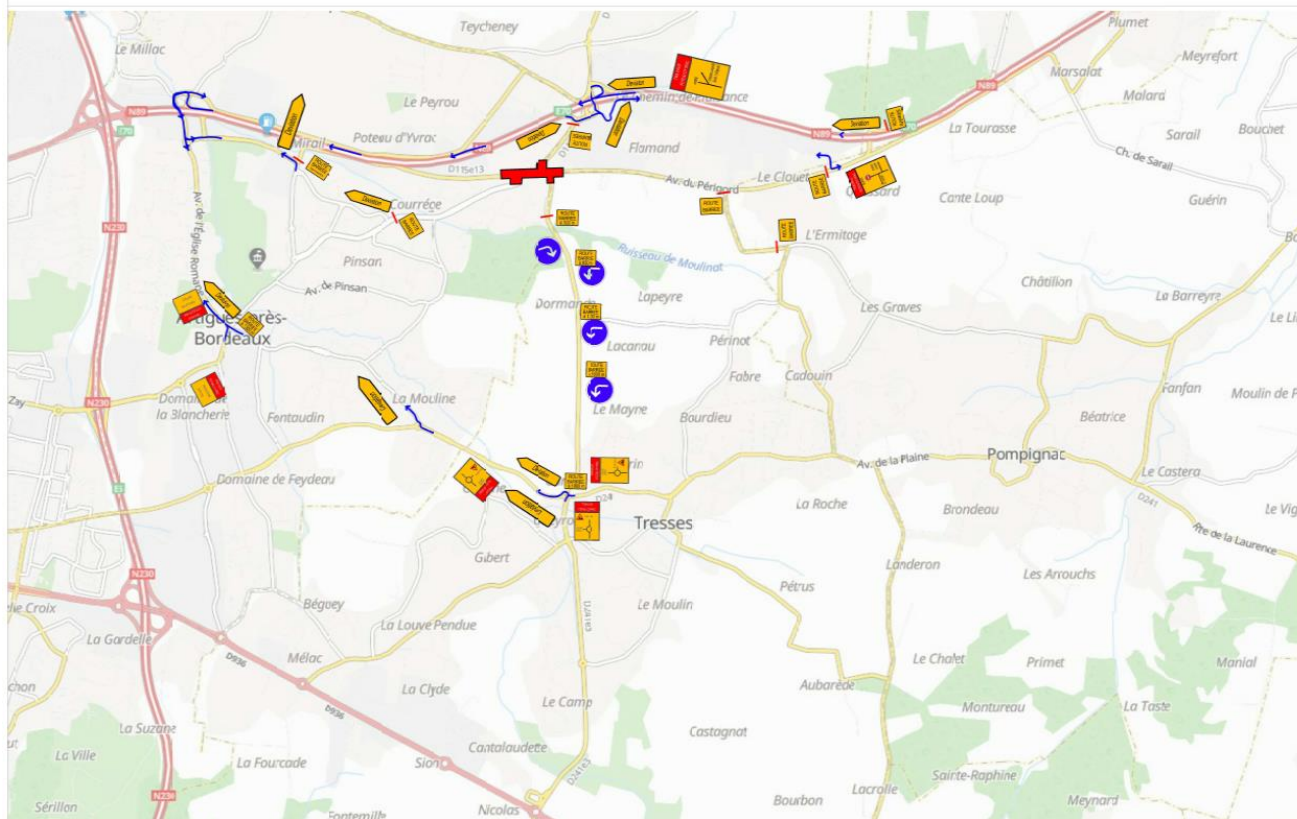

Le montant des travaux

- **Travaux d'enfouissement des réseaux**

- **Dissimulation de la HTA :**


- Soit un coût de 38 000€ TTC

- **Dissimulation du réseau Basse tension/ Télécom et éclairage public sur 300m**

- Enfouissement Basse tension = soit un coût de 118 000 € HT
 - Enfouissement réseau télécom = soit un coût de 31 506,35 € HT
 - Enfouissement réseau éclairage public = soit un coût de 66 401,47 € HT

- **Travaux VRD**

- 1,26 M€ TTC

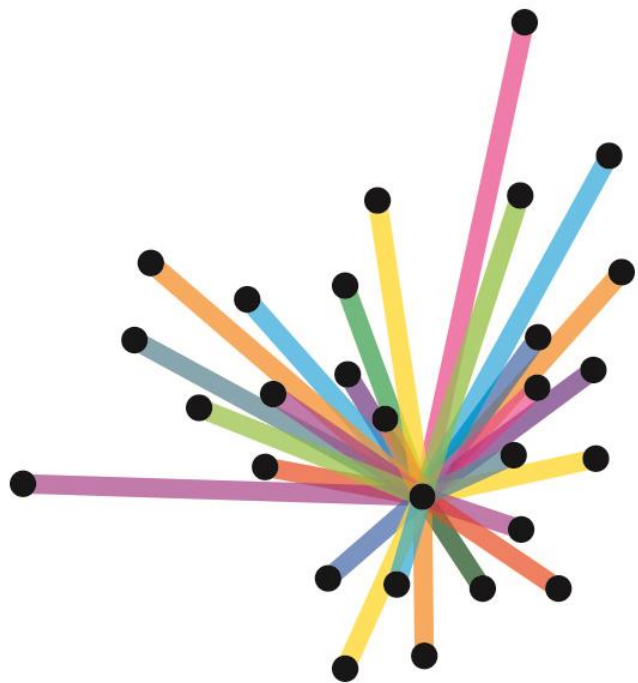

**BORDEAUX
MÉTROPOLE**
